

# Gantogram

---

**Novak, Leon**

**Supplement / Prilog**

*Publication year / Godina izdavanja:* **2019**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:173402>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2020-11-25**



*Repository / Repozitorij:*

[University North Digital Repository](#)

Voditelj projekta

Datumi projekta

2014.03.19 - 2014.08.20

Dovršenost

0%

Zadaci

33

Resursi

0

Zadaci


Naziv	Početni datum	Završni datum
Izgradnja bioplinskog postrojenja	2014.03.19	2014.08.19
1.ZEMLJANI RADOVI	2014.03.19	2014.04.24
1.1. strojni iskop humusa	2014.03.19	2014.03.20
1.2. strojni široki iskop materijala 3. ktg.	2014.03.21	2014.03.25
1.3. strojni iskop materijala za temeljne trake i stope	2014.03.26	2014.03.26
1.4. planiranje i nabijanje posteljice	2014.03.27	2014.03.27
1.5. Dobava, nasipavanje, planiranje i nabijanje šljunčanog materijala Dobava, nasipavanje, planiranje i nabijanje šljunčanog materijala	2014.03.28	2014.04.15
1.6. Utovar, odvoz i istovar na deponiju udaljenu do 10 km viška materijala od iskopa.	2014.04.16	2014.04.24
2.BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI	2014.04.16	2014.06.04
2.1. Betoniranje temeljnih traka betonom C16/20 u zemlji	2014.04.16	2014.04.16
2.2. Betoniranje AB nadtemeljnih serklaža, temeljnih greda, postolja i sl.	2014.04.22	2014.04.23
2.3. Betoniranje gornje AB podne ploče platoa kontejnera betonom C25/30	2014.04.23	2014.04.23
2.4. Betoniranje AB podne ploče prostora za punjenje betonom C30/37	2014.04.25	2014.04.25
2.5. Betoniranje AB podnih ploča digestora, platforme i postdigestora betonom C30/37 (d=20 cm)	2014.04.23	2014.04.29
2.6. Betoniranje AB vertikalnih zidova cilindričnih građevina digestora i postdigestora	2014.05.29	2014.06.04
2.7. Dobava, siječenje, savijanje i polaganje jednostavne i srednje složene armature za sve AB stavke.	2014.04.17	2014.05.20
3. TESARSKI RADOVI	2014.04.14	2014.06.12
3.1. Izrada, montaža i demontaža oplata AB nadtemeljnih serklaža, temeljnih greda, postolja i sl.	2014.04.14	2014.04.21
3.2. Izrada, montaža i demontaža gornje AB podne ploče platoa kontejnera C25/30.	2014.04.22	2014.04.22
3.3. Izrada, montaža i demontaža AB podne ploče prostora za punjenje betonom C30/37 (d=20 cm)	2014.04.23	2014.04.24
3.4. Izrada, montaža i demontaža glatke oplata AB podnih ploča digestora, platforme i postdigestora	2014.04.16	2014.04.22
3.5. 3.5. Izrada, montaža i demontaža glatke oplata AB vertikalnih zidova cilindričnih građevina digestora i postdigestora	2014.05.09	2014.06.12
4. IZOLATERSKI RADOVI	2014.06.11	2014.07.04
4.1. Dobava i postava toplinske izolacije podova građevine digestora i postdigestora	2014.06.20	2014.06.25
4.2. Dobava i postava toplinske izolacije AB zuba s vanjske strane pločama ekstrudirane polistirenske pjene debljine 5 cm.	2014.06.26	2014.07.04
4.3. Dobava i postava hidroizolacije podova i zidova građevine	2014.06.11	2014.06.19
5. LIMARSKI RADOVI	2014.07.07	2014.08.19
5.1. Izrada, dobava i montaža limenog opšava strojarskih proboja na fasadi i krovu građevine	2014.07.07	2014.07.07
5.2. Izrada, dobava i montaža limenog opšava spoja fasade građevina digestora i postdigestora s čeličnim platformama.	2014.07.08	2014.07.09
5.3. Dobava i montaža ventilirane fasade građevine okruglog tlocrtnog presjeka	2014.07.16	2014.08.19

## Zadaci


Naziv	Početni datum	Završni datum
6. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI	2014.06.11	2014.06.13
6.1. Gletanje vanjskih AB površina betoniranih u glatkoj oplati	2014.06.11	2014.06.12
6.2. Bojanje 2x svih gletanih vanjskih AB površina građevine disperzivnom bojom za beton za vanjske površine	2014.06.13	2014.06.13

Gantt-ov dijagram

2014

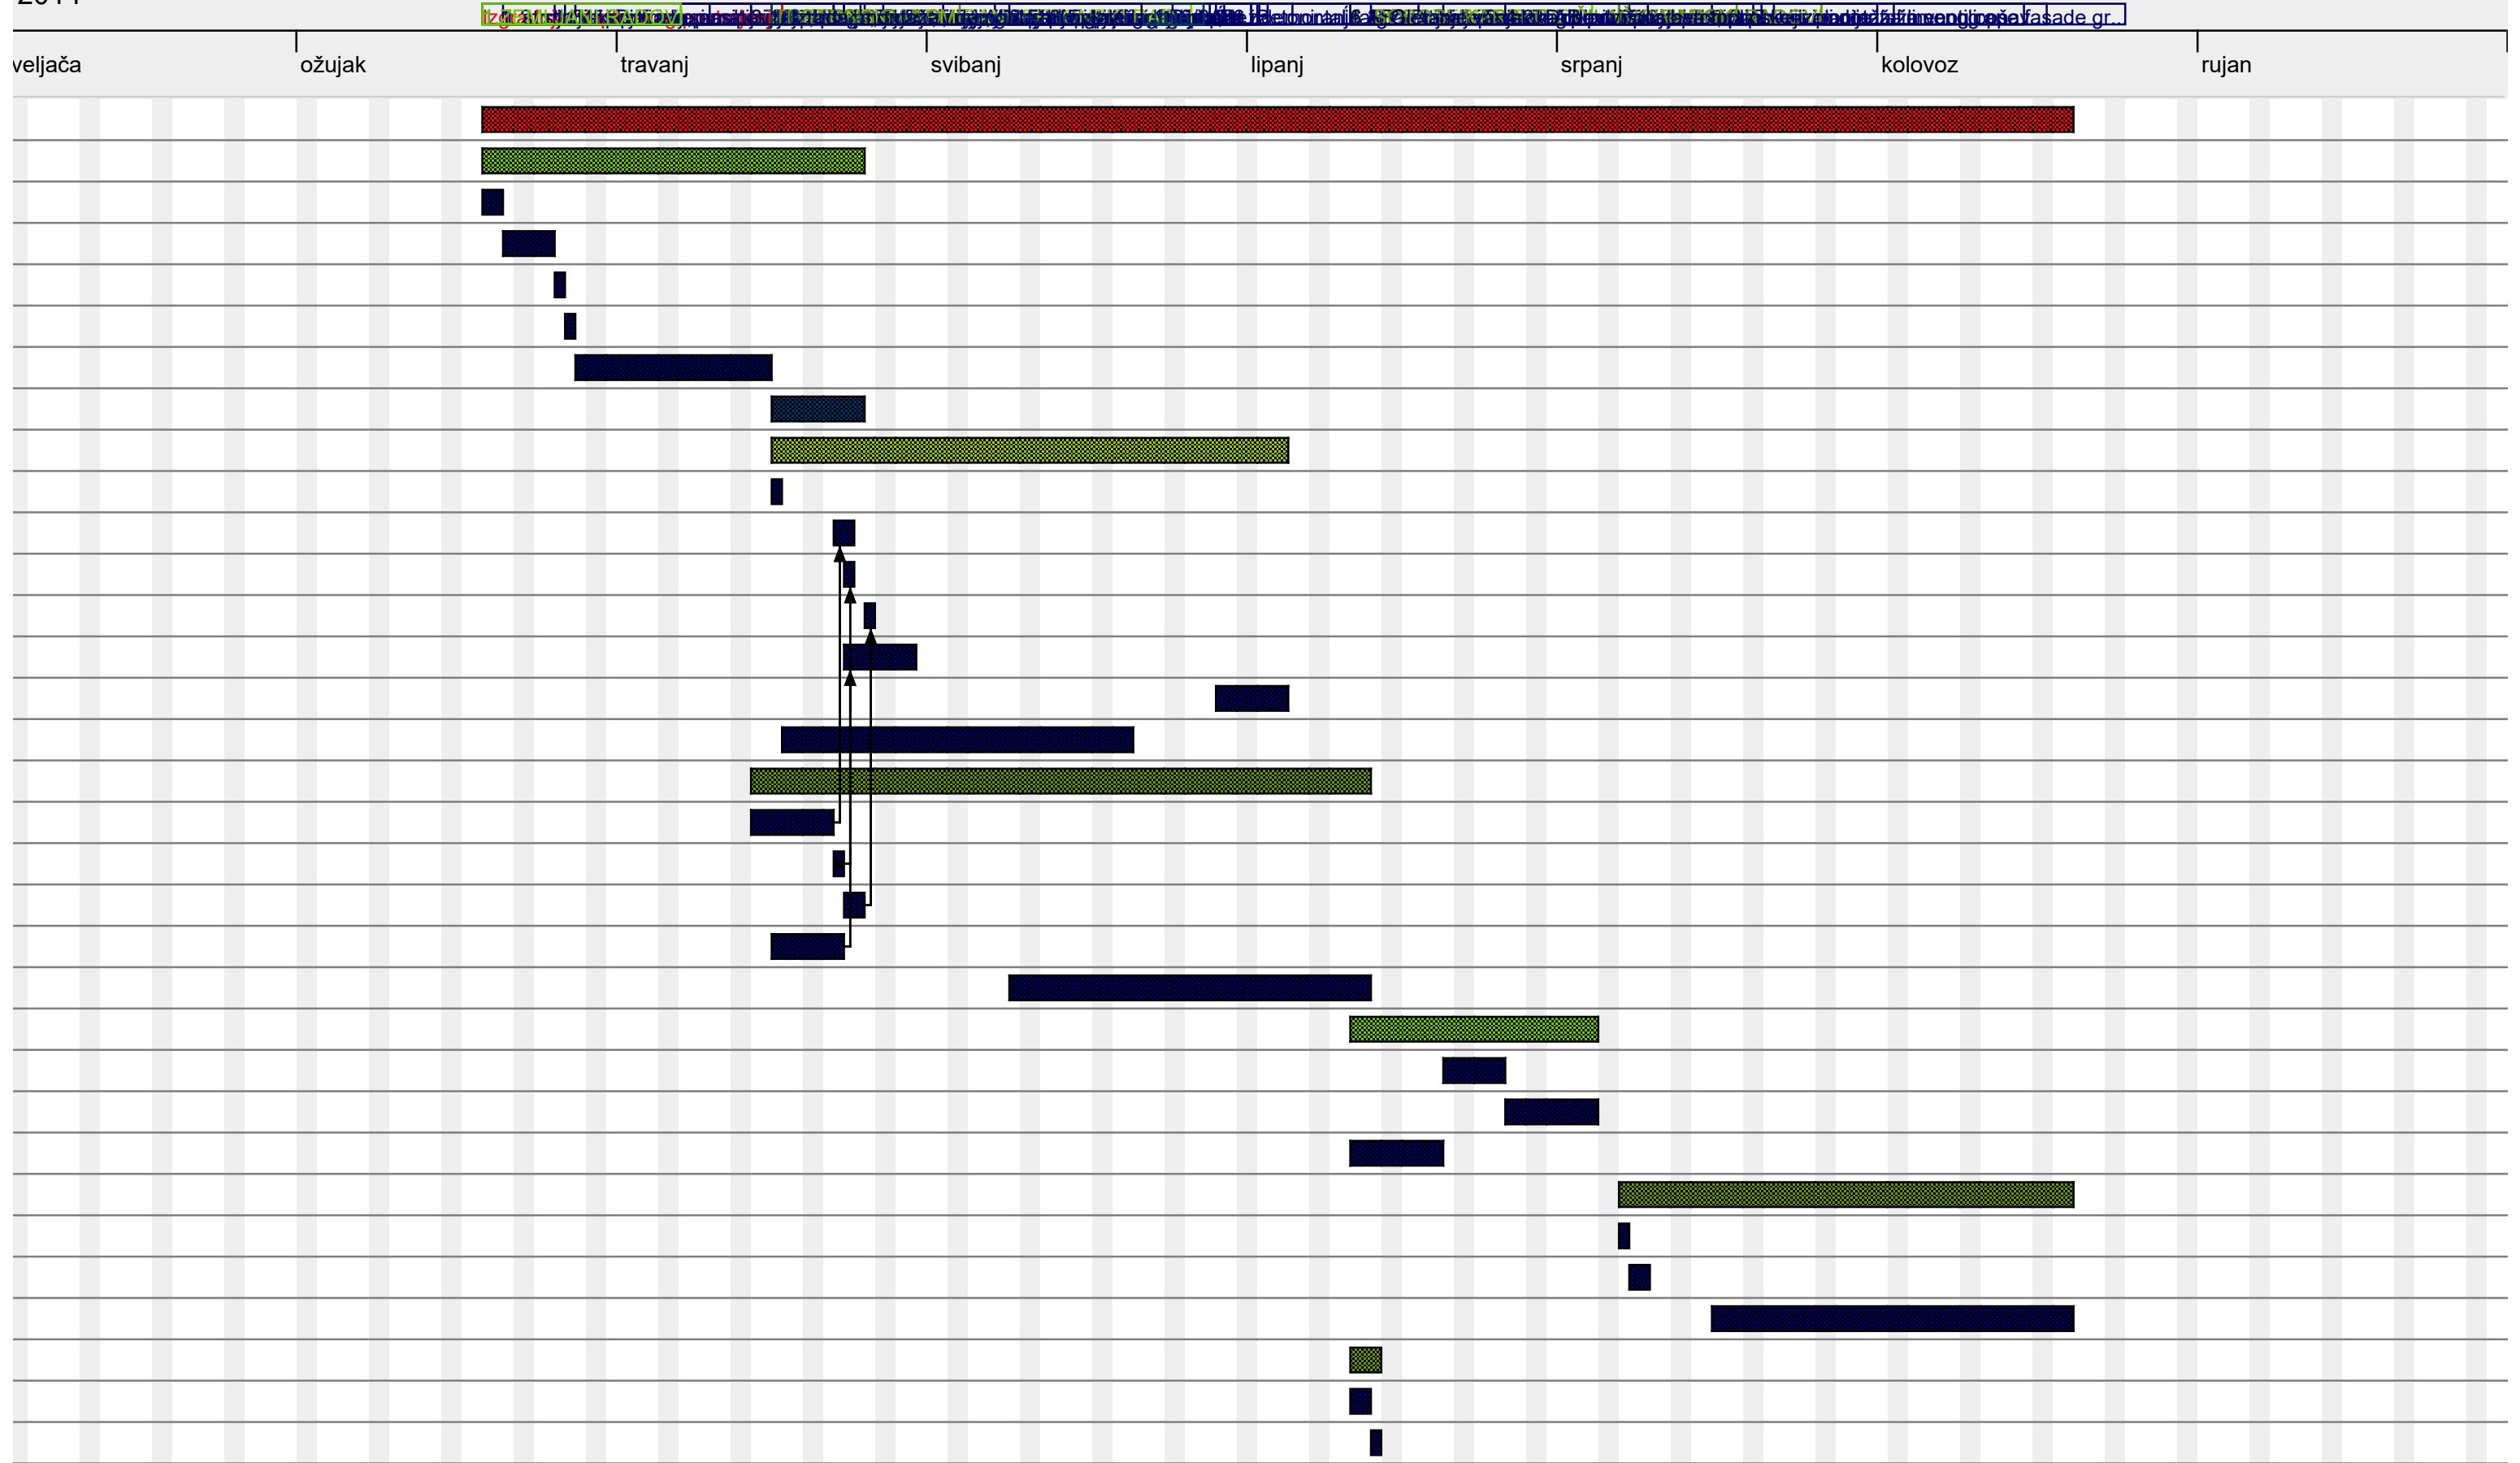

# Dijagram Resursa

		2014							
Ime	Zadana u...	veljača	ožujak	travanj	svibanj	lipanj	srpanj	kolovoz	rujan
